

특 수 공 시

(단위:백만원)

사 업 명	소관 실국	사업 기간	총사업비	기투자	2009투자	종합 진도	비고
1 노근리 평화공원조성	행정국	2005 ~2010	19,137	3,964	3,395	45%	
2 살기좋은지역만들기 시범사업	군 형 발전국	2007 ~2009	4,000	2,400	1,600	100%	
3 도시저소득주민 주거환경개선사업	"	2001 ~2012	72,334	59,120	4,286	74%	
4 지방도정비	건 설 방재국	계속	3,048	1,326	694	50%	
5 수해상습지개선사업	"	1999 ~2018	12,439	1,986	424	19%	
6 중부신도시 진입도로건설	"	2007 ~2012	81,018	2,344	9,414	15%	
7 도로명주소사업	"	1998 ~2011	18,632	10,902	7,306	99%	
8 농어촌뉴타운조성사업	농정국	2009 ~2011	14,586	0	477	10%	
9 내수면연구소 남부지소 신축공사	"	2008 ~2009	5,726	1,031	2,695	70%	
10 충주의료원 이전신축 BTL사업	보건복지 여 성 국	2007 ~2012	57,726	1,271	43	5%	
11 농어촌생활용수개발사업	문화관광 환 경 국	1998 ~2014	2,948	1,295	173	49%	
12 보건환경연구원 이전청사 신축공사	보건환경 연 구 원	2006 ~2010	12,000	6,888	4,763	99%	
13 백두대간 생태교육장 조성	산림환경 연 구 소	2006 ~2009	3,708	2,708	997	100%	

1. 노근리 평화공원 조성

□ 사업개요

- 사업목적 : 노근리사건희생자를 추모하기위한 평화공원 조성
- 사업기간 : 2005. 1. ~ 2010. 12.
- 사업량 : 132,240m²
- 사업내용 : 평화기념관, 위령탑, 공원조성시설
- 총사업비 : 19,137백만원(국비)

□ 추진계획

총 사업계획			2009년도 사업계획	
사업량	사업기간	사업비	사업량	사업비
1개소 (132,240m ²)	2005~2010	19,137백만원	1개소 (132,240m ²)	3,509백만원

□ 2009 추진실적

- 예산집행현황

예산집행현황				예산 집행률 (b+c)/a×100	종합 진도
사업비(a)	기집행(b)	2009집행(c)	향후 집행		
19,137백만원	3,964백만원	3,395백만원	11,778백만원	38%	45%

- 사업추진현황
 - 평화공원조성 기반공사 착공('08. 6)
 - 평화기념관 실시 설계('09. 12)

□ 사업효과

- 노근리 사건 희생자 및 유족의 명예를 회복
- 인권존중과 평화의 소중함을 학습할 수 있는 교육의 장소 제공

□ 위치도



□ 역사공원배치도



2. 살기좋은 지역만들기 시범사업

□ 사업개요

- 사업목적 : 아름답고 쾌적하고 특색있는 지역창조를 통한 공간과 삶의 질 향상, 지역공동체 형성 및 소득기반 강화
- 사업기간 : 2007년 ~ 2009년
- 사업량 : 2개군(보은군, 단양군)
- 사업내용 : 대추테마공원 · 체험장 조성, 문화의 거리 조성 등
- 총 사업비 : 4,000백만원(국비)
 - 보은군 2,050, 단양군 1,950

□ 추진계획

총 사업계획			2009년도 사업계획	
사업량	사업기간	사업비	사업량	사업비
2개군	2007. 01 ~ 2009. 12	4,000백만원 (국비)	2개군	1,600백만원 (국비)

□ 2009 추진실적

- 예산집행현황

예산집행현황				예산 집행률 (b+c)/a×100	종합 진도
사업비(a)	기집행(b)	2009집행(c)	향후 집행		
4,000백만원	2,400백만원	1,600백만원	-	100%	100%

- 사업추진현황

- 문화의 거리 조성, 대추테마공원 · 체험장 등 완료(2009. 12월)

□ 사업효과

- 지역의 특성을 반영한 발전기반 마련
- 지역의 인지도, 친밀성 등 지역브랜드 창출 기여
- 지역공동체 활성화 및 삶의 질 향상

□ 관련사진

단양군 문화의 거리



3. 도시저소득주민 주거환경개선사업

□ 사업개요

- 사업목적 : 도시저소득 밀집지역의 열악한 주거환경개선
- 사업기간 : 2001년 ~ 2012년
- 사업량 : 19개지구
- 사업내용 : 도로, 공원, 공용주차장 등 도시기반시설 정비
- 총 사업비 : 72,334백만원(국비50%, 도비10%, 시비 40%)

□ 추진계획

총 사업계획			2009년도 사업계획	
사업량	사업기간	사업비	사업량	사업비
19개지구	2001년~2012년	72,334백만원	3개지구	4,286백만원

□ 2009 추진실적

- 예산집행현황

예산집행현황				예산 집행률 (b+c)/a×100	종합 진도
사업비(a)	기집행(b)	2009집행(c)	향후 집행		
72,334백만원	59,120백만원	4,286백만원	8,928백만원	88%	74%

- 사업추진현황
 - 총 19개지구 중 14개지구 완공

□ 사업효과

- 도시 밀집지역의 열악한 주거환경개선으로 주민의 삶의 질 향상
- 도시기반시설 정비로 지역 균형발전 개발 유도
- 공공시설 정비로 지역 이미지 개선 및 도시 미관 향상

4. 지방도 정비

□ 사업개요

- 위 치 : 도내 일원 26개소(계속 10개소, 신규 16개소)
- 사업량 : L=57.5km(계속 39.9km, 신규 17.6km)
- 총사업비 : 3,048억원

□ 추진계획

(단위 : km,억원)

사업명	총 사업계획			2009년도사업계획	
	사업량	사업기간	사업비	사업량	사업비
26개사업	57.5		3048	57.5	694
황석 ~ 구룡	3.1	'04~'09	110	3.1	20
방곡 ~ 울산	4.8	'04~'10	137	4.8	24
송치 ~ 가래울	6.2	'04~'09	166	6.2	43
오창 ~ 증평IC	5.6	'02~'09	516	5.6	117
성산 ~ 두릉	6.3	'02~'10	499	6.3	56
부강철도가도교	0.5	'05~'10	109	0.5	47
하리 ~ 송정	1.2	'07~'09	39	1.2	14
세교 ~ 비중	0.9	'07~'09	73	0.9	34
영하 ~ 우산	1.0	'07~'10	64	1.0	23
송정 ~ 평촌	1.3	'07~'10	53	1.3	15
신기 ~ 원당	2.3	'07~'09	50	2.3	16
문강 ~ 수회	2.2	'08~'11	61	2.2	20
장암 ~ 지경	2.3	'08~'10	49	2.3	20
부산 ~ 사오	1.2	'08~'10	53	1.2	39
덕 동 교	1.0	'08~'09	16	1.0	6
오송역진입도로	0.4	'09~'11	220	0.4	120
석화 ~ 초정	1.3	'09~'11	67	1.3	25
백자 ~ 남천	0.5	'09~'10	16	0.5	10
옥천 ~ 동이	1.7	'08~'12	164	1.7	8
덕산 ~ 산업단지	4.1		8	설계완료	3
이월 ~ 산업단지	3.2		12	설계완료	7
속리산연계도로	1.0	'08~'11	148	1.0	8
증평 ~ 용강	1.4	'08~'12	110	1.4	3
용강 ~ 청안	2.4	'08~'13	123	2.4	4
교원대-태성(탑연-다락)	1.6	'08~'13	183	1.6	10
도로기본계획	1식	'09~'10	2	1식	2

□ 2009 추진실적

○ 예산집행현황

사업명	예산집행현황(백만원)				예산 집행률 (b + c) / a × 100	종합 진도
	사업비(a)	기집행(b)	2009 집행 c	향후집행		
26개사업	3048	1326	694	1028	66	50
황석 ~ 구룡	110	90	20	0	100	100
방곡 ~ 울산	137	86	24	27	80	95
송치 ~ 가래울	166	123	43	0	100	100
오창 ~ 증평IC	516	399	117	0	100	98
성산 ~ 두릉	499	348	56	95	81	65
부강철도가도교	109	49	47	13	88	55
하리 ~ 송정	39	25	14	0	100	94
세교 ~ 비중	73	39	34	0	100	100
영하 ~ 우산	64	32	23	9	86	50
송정 ~ 평촌	53	29	15	9	83	56
신기 ~ 원당	50	34	16	0	100	90
문강 ~ 수회	61	8	20	33	46	45
장암 ~ 지경	49	11	20	18	63	45
부산 ~ 사오	53	10	39	4	92	75
덕 동 교	16	10	6	0	100	100
오송역진입도로	220	0	120	100	55	보상중
석화 ~ 초정	67	0	25	42	37	20
백자 ~ 남천	16	0	10	6	62	80
옥천 ~ 동이	164	5	8	151	8	공사중
덕산 ~ 산업단지	8	5	3	0	100	설계중
이월 ~ 산업단지	12	5	7	0	100	설계중
속리산연계도로	148	3	8	137	7	공사중
증평 ~ 용강	110	2	3	105	5	공사중
용강 ~ 청안	123	3	4	116	6	공사중
교원대-태성(탑안-다락)	183	10	10	163	11	공사중
도로기본계획	2	0	2	0	100	50

○ 사업추진현황

- '07년 준공지구 : 3개소 8.9km
- '08년 준공지구 : 10개소 18.6km
- '09년 계속·신규 지구 : 26개소 57.5km

□ 향후 사업계획

- 지역 균형발전 촉진과 공사지연에 따른 주민불편 최소화를 위해 지속 추진

5. 수해상습지개선사업

□ 사업개요

- 사업목적 : 하천개수를 통한 재해 예방으로 도민생명과 재산보호
- 사업기간 : 1999년 ~ 2018년
- 사업량 : L=820.2km
- 사업내용 : 축제 및 호안
- 총 사업비 : 12,439억원(국비60%, 도비40%)

□ 추진계획

총 사업계획			2009년도 사업계획	
사업량	사업기간	사업비	사업량	사업비
820.2km	1999 ~ 2018	12,439억원	24.2km	424억원

□ 2009 추진실적

- 예산집행현황


예산집행현황				예산 집행률 (b+c)/a×100	종합 진도
사업비(a)	기집행(b)	2009집행(c)	향후 집행		
12,439억원	1,986억원	424억원	10,029억원	19.3%	19.3%

- 사업추진현황
 - '09년 22지구 24.2km 차수 준공

□ 사업효과

- 환경친화적 하천정비로 주민의 편익도모 및 삶의 질 향상

□ 위치도

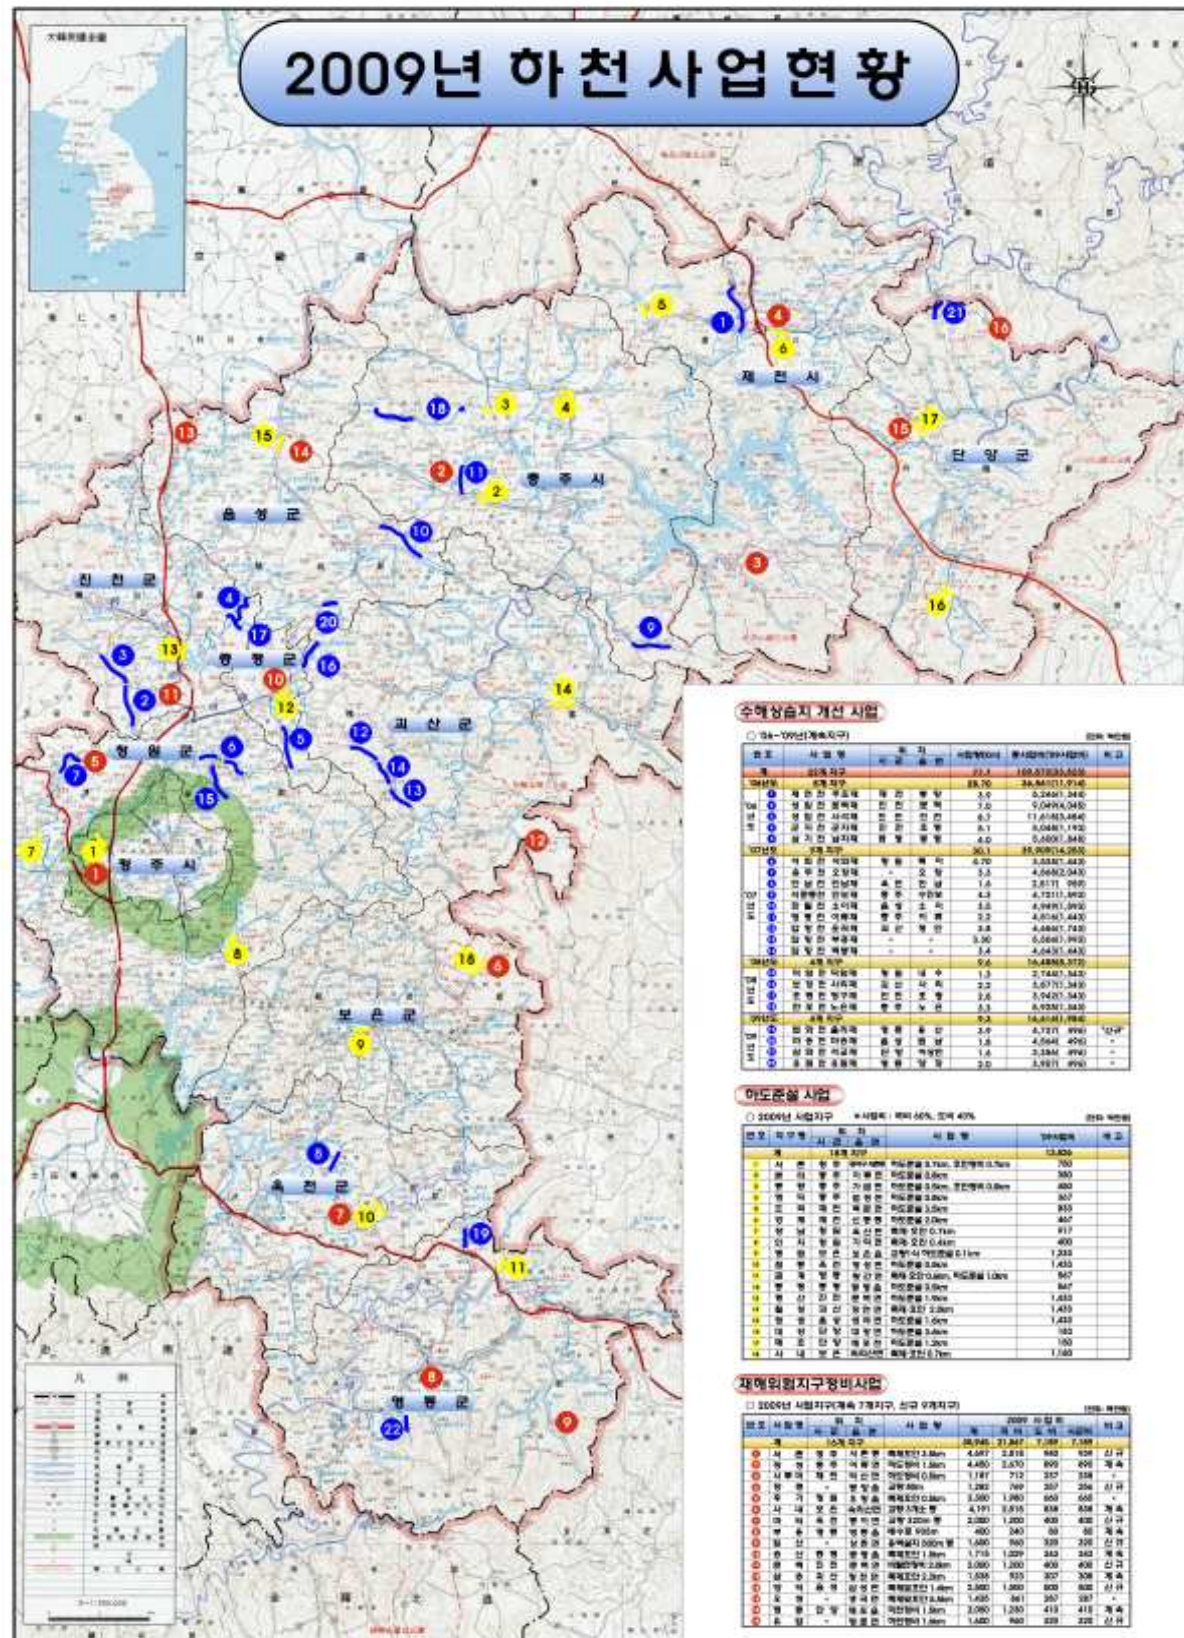

2009년 하천사업현황

수해상습지 개선사업

○ 2009년 계획사업

구분	구분명	구분	사업비(백만원)	공사비(백만원)	비고
총	수해상습지 개선사업		27.4	169,573,645,820	
연	○ 1월	수해상습지 개선사업	8.70	26,863,071,074	
	○ 2월	수해상습지 개선사업	3.0	9,049,049	
	○ 3월	수해상습지 개선사업	6.7	17,618,444	
	○ 4월	수해상습지 개선사업	6.1	9,049,142	
	○ 5월	수해상습지 개선사업	6.0	9,049,142	
구	○ 1. 유역관리	유역관리	30.1	18,000,142,000	
	○ 1.1 유역관리	유역관리	30.1	18,000,142,000	
	○ 1.1.1 유역관리	유역관리	3.0	4,000,000,000	
	○ 1.1.2 유역관리	유역관리	1.6	2,000,000,000	
	○ 1.1.3 유역관리	유역관리	4.3	4,711,000,000	
	○ 1.1.4 유역관리	유역관리	1.8	2,000,000,000	
	○ 1.1.5 유역관리	유역관리	3.2	4,000,000,000	
	○ 1.1.6 유역관리	유역관리	3.8	4,000,000,000	
	○ 1.1.7 유역관리	유역관리	3.3	5,000,000,000	
	○ 1.1.8 유역관리	유역관리	3.4	4,000,000,000	
구	○ 2. 하천정비	하천정비	0.6	16,888,503,820	
	○ 2.1 하천정비	하천정비	1.3	2,000,000,000	
	○ 2.2 하천정비	하천정비	2.2	4,000,000,000	
	○ 2.3 하천정비	하천정비	3.8	10,888,503,820	
구	○ 3. 하천유지	하천유지	3.3	8,000,000,000	
	○ 3.1 하천유지	하천유지	3.0	7,000,000,000	
	○ 3.2 하천유지	하천유지	0.3	1,000,000,000	
	○ 3.3 하천유지	하천유지	0.0	0,000,000,000	

하도정선사업

○ 2009년 사업지구

구분	구분명	구분	사업비(백만원)	공사비(백만원)	비고
총	하도정선사업		13,820		
○ 1월	하도정선사업	하도정선사업	700		
○ 2월	하도정선사업	하도정선사업	300		
○ 3월	하도정선사업	하도정선사업	400		
○ 4월	하도정선사업	하도정선사업	800		
○ 5월	하도정선사업	하도정선사업	800		
○ 6월	하도정선사업	하도정선사업	800		
○ 7월	하도정선사업	하도정선사업	800		
○ 8월	하도정선사업	하도정선사업	800		
○ 9월	하도정선사업	하도정선사업	800		
○ 10월	하도정선사업	하도정선사업	800		
○ 11월	하도정선사업	하도정선사업	800		
○ 12월	하도정선사업	하도정선사업	800		

재해위험지구정비사업

○ 2009년 사업지구(계속 7명지구, 신규 9명지구)

구분	구분명	구분	사업비(백만원)	공사비(백만원)	비고
총	재해위험지구정비사업		25,945,31,847	1,099,7,589	
○ 1월	재해위험지구정비사업	재해위험지구정비사업	4,487,2,818	940,128	신규
○ 2월	재해위험지구정비사업	재해위험지구정비사업	4,485,2,816	939,940	계속
○ 3월	재해위험지구정비사업	재해위험지구정비사업	1,187,712	257,358	-
○ 4월	재해위험지구정비사업	재해위험지구정비사업	1,200,749	207,256	신규
○ 5월	재해위험지구정비사업	재해위험지구정비사업	3,559,1,969	669,569	-
○ 6월	재해위험지구정비사업	재해위험지구정비사업	4,191,3,819	838,858	계속
○ 7월	재해위험지구정비사업	재해위험지구정비사업	2,080,1,000	400,400	신규
○ 8월	재해위험지구정비사업	재해위험지구정비사업	-	340,50	계속
○ 9월	재해위험지구정비사업	재해위험지구정비사업	1,680,960	330,250	신규
○ 10월	재해위험지구정비사업	재해위험지구정비사업	1,710,1,029	242,242	계속
○ 11월	재해위험지구정비사업	재해위험지구정비사업	2,080,1,000	400,400	신규
○ 12월	재해위험지구정비사업	재해위험지구정비사업	2,600,935	307,308	계속
○ 1월	재해위험지구정비사업	재해위험지구정비사업	2,600,1,000	400,400	신규
○ 2월	재해위험지구정비사업	재해위험지구정비사업	1,680,960	330,250	-
○ 3월	재해위험지구정비사업	재해위험지구정비사업	2,080,1,000	400,400	계속
○ 4월	재해위험지구정비사업	재해위험지구정비사업	2,080,1,000	400,400	계속
○ 5월	재해위험지구정비사업	재해위험지구정비사업	2,080,1,000	400,400	계속
○ 6월	재해위험지구정비사업	재해위험지구정비사업	2,080,1,000	400,400	계속
○ 7월	재해위험지구정비사업	재해위험지구정비사업	2,080,1,000	400,400	계속
○ 8월	재해위험지구정비사업	재해위험지구정비사업	2,080,1,000	400,400	계속
○ 9월	재해위험지구정비사업	재해위험지구정비사업	2,080,1,000	400,400	계속
○ 10월	재해위험지구정비사업	재해위험지구정비사업	2,080,1,000	400,400	계속
○ 11월	재해위험지구정비사업	재해위험지구정비사업	2,080,1,000	400,400	계속
○ 12월	재해위험지구정비사업	재해위험지구정비사업	2,080,1,000	400,400	계속

6. 중부신도시 진입도로건설

□ 사업개요

- 사업목적 : 진천·음성 혁신도시 조기 활성화 및 지역균형발전도모
- 사업기간 : '07 ~ '12
- 사업량 : 도로 L = 6.02km (4차로)
- 사업내용 : 진천·음성 혁신도시(중부신도시) 진입도로 확·포장공사
- 총사업비 : 81,018백만원 (국비 100%)

□ 추진계획

총 사업계획			2009년도 사업계획	
사업량	사업기간	사업비	사업량	사업비
1개소 (L = 6.02km)	2007 ~ 2012.	81,018백만원	1개소	14,000백만원

□ 2009 추진실적

○ 예산집행현황

예산집행현황				예산 집행률 (b+c)/a×100	종합 진도
사업비(a)	기집행(b)	2009집행(c)	향후 집행		
81,018백만원	2,344백만원	9,414백만원	69,260백만원	14.5%	14.5%


○ 사업추진현황

- 진천·음성 혁신도시(중부신도시) 진입도로 기본 및 실시설계 완료
- 진천·음성 혁신도시(중부신도시) 진입도로 제영향평가 완료
- 진천·음성 혁신도시(중부신도시) 진입도로 편입용지 보상 추진

□ 사업효과

- 진천·음성 혁신도시(중부신도시) 조기건설 및 활성화 기대

□ 위치도

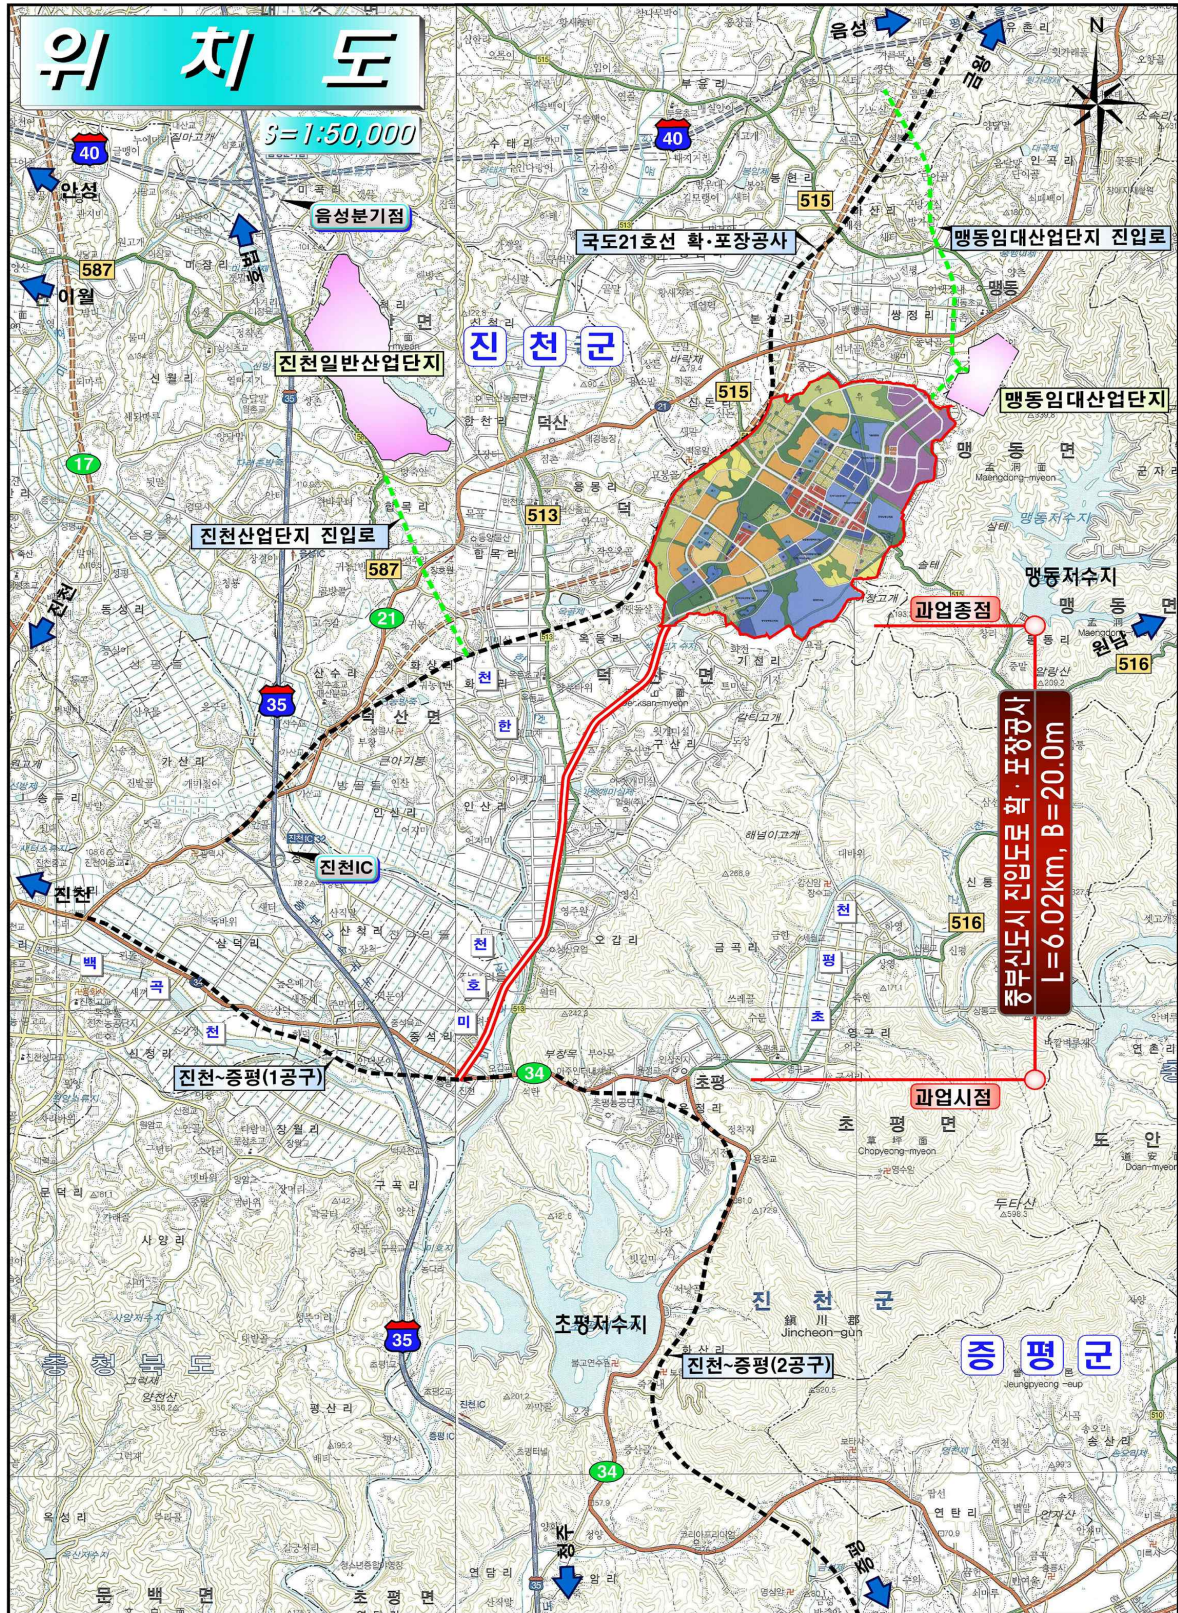

7. 도로명주소사업

□ 사업개요

- 사업목적 : 국민생활의 불편해소 및 물류비용절감 등 국가 경쟁력 향상
- 사업기간 : 1998. 2 ~ 2011. 12.
- 사업량 : 12개 시·군 (7,433km²)
- 사업내용 : 도로구간·도로명부여와 시설물설치 및 정비추진 등
- 총 사업비 : 18,632백만원(국비28%, 도비15%, 시군비 57)

□ 추진계획

총 사업계획			2009년도 사업계획	
사업량	사업기간	사업비	사업량	사업비
7,433km ²	1998~2011	18,632백만원	7,433km ²	7,306백만원

□ 2009 추진실적

- 예산집행현황

예산집행현황(백만원)				예산 집행률 (b+c)/a×100	종합 진도
사업비(a)	기집행(b)	2009집행(c)	향후 집행		
18,632	10,902	7,306	424	97.7%	99%

- 사업추진현황

- 도로구간·기초번호 설정 및 도로명·건물번호 부여
 - ※ 도로명판 및 건물번호판 설치 : 충주시외 10개 시군 완료, 청주시 90%
- 새주소 통합센터 D/B 정비 및 자료제공
- 사업 인지도 제고 및 법적주소 전환에 따른 지속적인 홍보추진

□ 사업효과

- 복잡한 지번주소를 도로명 주소로 전환하여 국민의 주소찾기 불편 해소
- 물류비용 절감 등 국가 경쟁력 강화
- 주민편익을 위한 위치정보 인프라 구축

□ 홍보추진자료



시민단체와 공동 가두 캠페인 전개



유아용 책자 발간



TV 홍보



달력 제작 홍보

8. 농어촌 뉴타운조성 시범사업

□ 사업개요

- 사업목적 : 도시거주 젊은 인력을 농어촌으로 유치하여 농업의 핵심 주체로 육성함으로써 농어업의 경쟁력 제고 및 살맛나는 농어촌조성
- 사업기간 : 2009. 1. ~ 2011. 12.
- 사업량 : 139,908m²(단독주택 70세대, 타운하우스 30세대)
- 사업내용 : 주거시설, 공공편익시설, 도로, 상하수도, 공원·녹지 등
- 총 사업비 : 14,586백만원(국비70%, 도비9%, 군비21%)

□ 추진계획

총 사업계획			2009년도 사업계획	
사업량	사업기간	사업비	사업량	사업비
1개소 (139,908m ²)	2009. 01 ~ 2011. 12	14,586백만원	1개소 (139,908m ²)	477백만원

□ 2009 추진실적

- 예산집행현황

예산집행현황				예산 집행률 (b+c)/a×100	종합 진도
사업비(a)	기집행(b)	2009집행(c)	향후 집행		
14,586백만원	-	477백만원	14,109백만원	4%	10%

- 사업추진현황
 - 기본계획수립 완료

□ 사업효과

- 도시 젊은 인력 유입으로 경쟁력 제고로 돈버는 농촌, 살맛나는 농촌 건설

□ 위치도



□ 단지배치도



9. 내수면연구소남부지소 신축공사

□ 사업개요

- 사업목적 : 남부지역 내수면어업 활성화 및 어업인 소득증대
- 사업기간 : 2008. 12. ~ 2009. 11.
- 사업량 : 부지 18천㎡, 시설물 4,672㎡, 취수용수 2천톤/일
- 사업내용 : 18종 (어류사육시설 및 운영관리시설)
- 총 사업비 : 5,726백만원(균특, 분권, 특별교부세)

□ 추진계획

총 사업계획			2008년도 사업계획	
사업량	사업기간	사업비	사업량	사업비
1개소	`08. 12~`09. 11	5,726백만원	1개소	1,204 (도비부담액)

□ 2008 추진실적

○ 예산집행현황

예산집행현황				예산 집행률 (b+c)/a×100	종합 진도
사업비(a)	기집행(b)	2008집행(c)	향후 집행		
5,726백만원	1,031백만원	2,695백만원	2,000백만원	65%	70%


○ 사업추진현황

- 공사기간 : `08. 12. 10 ~ `09. 7. 30
- 전체공정율 : 70% (12종 공사완료, 4종 공사진행중)

□ 사업효과

- 대청호, 금강수계 수산자원 이용한 내수면어업육성 및 수중생태 보호
- 부가가치 높은 민물고기 소득자원화로 지역경제 활성화 기여

□ 위치도

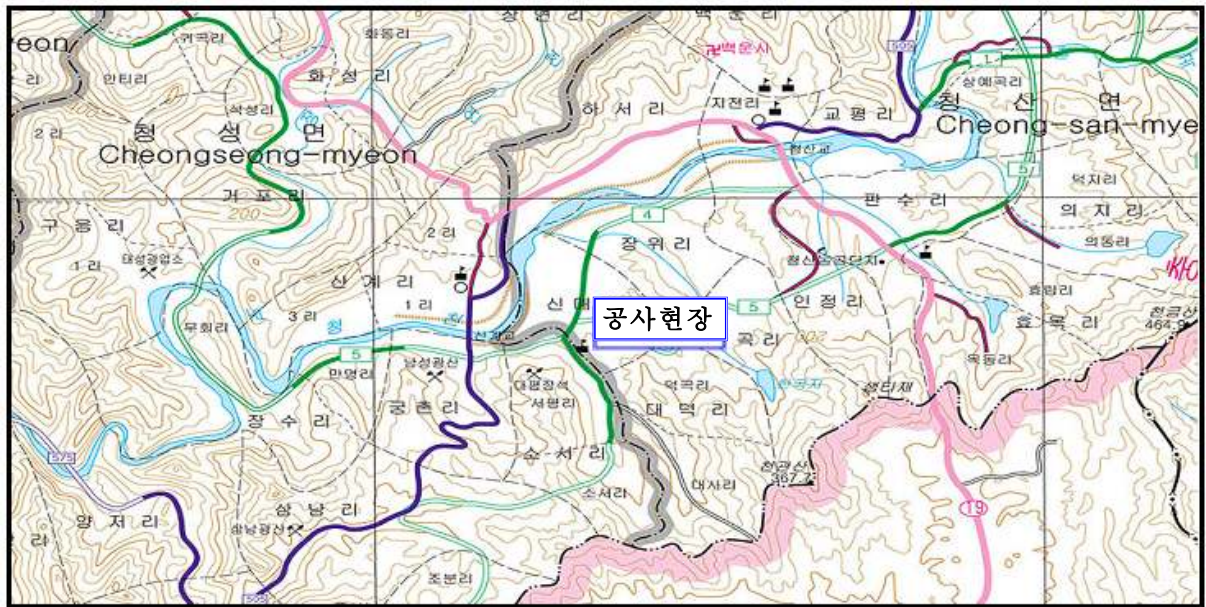

□ 단지배치도 (조감도)



10. 충주의료원 이전신축 BTL 사업

□ 사업개요

- 사업목적 : 지방의료원 현대화 추진
- 사업기간 : 2007 ~ 2012. 3.
- 사업량 : 연면적 31,669.59㎡(지하3층, 지상4층)
- 사업내용 : 충주의료원 이전 신축
- 총 사업비 : 57,726백만원(도비 2.3%, 민자 97.7%)

□ 추진계획

총 사업계획			2009년도 사업계획	
사업량	사업기간	사업비	사업량	사업비
1개소	2007. 7~ 2012. 3	57,726백만원	1개소	43백만원

□ 2009 추진실적

○ 예산집행현황

예산집행현황				예산 집행률 (b+c)/a×100	종합 진도
사업비(a)	기집행(b)	2009집행(c)	향후 집행		
57,726백만원	1,271백만원	43백만원	56,412백만원	2.3%	5%

○ 사업추진현황

- BTL 시설사업기본계획 고시
- 부지매입 및 지장물 보상
- 민자사업계획서 평가 완료(우선협상대상자 선정 : 계룡건설산업)
- 도시계획시설 결정
- 실시협약체결
- 교통영향평가 완료

□ 사업효과

- 시설 장비 현대화를 통한 지역 보건서비스 향상
- 지역거점 공공병원의 경쟁력 강화 및 위상 제고

□ 조감도



11. 농어촌생활용수개발사업

□ 사업개요

- 사업목적 : 농촌지역 주민에게 깨끗하고 안정적인 생활용수 공급
- 사업기간 : 1998. 1. ~ 2014. 12.
- 사업량 : 89개면(기시행 74, 추진중 2, 향후 13)
- 사업내용 : 도내 면지역을 대상으로 지방상수도를 신설·확장
- 총 사업비 : 2,948억원(국비78%, 도비22%)

□ 추진계획

총 사업계획			2009년도 사업계획	
사업량	사업기간	사업비	사업량	사업비
89개면	1998. 1 ~ 2014. 12	2,948억원	25개면	173억원

□ 2009 추진실적

- 예산집행현황

예산집행현황				예산 집행률 (b+c)/a×100	종합 진도
사업비(a)	기집행(b)	2009집행(c)	향후 집행		
2,948억원	1,295억원	173억원	1,480억원	49%	49%

- 사업추진현황

- 10개시·군 17지구 25개면(신설 4, 확장 21)

□ 사업효과

- 맑고 깨끗한 물 공급으로 농촌지역 주민 건강증진 및 삶의 질 향상 기여

12. 보건환경연구원 이전청사 신축공사

□ 사업개요

○ 사업목적

- 오송생명과학단지내 식·의약품기관과 연계된 검사 효율성 제고
- 청사 신축을 통한 대민서비스 향상, 도민건강 증진 및 환경개선

○ 사업기간 : 2006. 9. ~ 2010. 6.

○ 사업량 : 5,637m²(지상3층, 지하 1층)

○ 사업내용 : 연구원 이전청사 신축

○ 총 사업비 : 12,000백만원

- 토지매입비 1,500, 시설비 9,011, 부대공사 334, 기타 1,155

□ 추진계획

총 사업계획			2009년도 사업계획	
사업량	사업기간	사업비	사업량	사업비
5,637m ²	2006. 9. ~ 2010. 6.	12,000백만원	5,637m ²	4,763백만원

□ 2009 추진실적

○ 예산집행현황

예산집행현황				예산 집행률 (b+c)/a×100	종합 진도
사업비(a)	기집행(b)	2009집행(c)	향후 집행		
12,000백만원	6,888백만원	4,763백만원	349백만원	97.1%	99%

○ 사업추진현황

- 이전청사 신축공사 착공

□ 사업효과

- 오송생명과학단지 입주 국책기관과의 연계를 통한 보건·환경 검사 분야의 대민서비스 증대 및 쾌적한 환경 조성

13. 백두대간 생태교육장 조성

□ 사업개요

- 사업목적 : 백두대간의 역사, 생태계 등 정보제공 및 체험학습장 조성을 통하여 백두대간 보호에 대한 국민의 인식 증진
- 사업기간 : 2006. 1. ~ 2009. 12.
- 사업량 : 부지면적 3,268㎡, 건축면적 610㎡(연면적 1,354㎡)
- 주요시설 : 지하 교육관, 역사관, 체험관, 세미나실, 야외전시 등
- 총사업비 : 3,708백만원(국비 50%, 도비 50%)
 - (06) 설계 96백만원 → (07) 건축 1,306 → (08) 건축·전시 1,306 → (09) 시설보완 1,000

□ 추진계획

총 사업계획			2009년도 사업계획	
사업량	사업기간	사업비	사업량	사업비
1개소 (3,268㎡)	2006. 1 ~ 2009. 12	3,708백만원	1개소 (지하층)	1,000백만원

□ 2009 추진실적

- 예산집행현황

예산집행현황				예산 집행률 (b+c)/a×100	종합 진도
사업비(a)	기집행(b)	2009집행(c)	향후 집행		
3,708백만원	2,708백만원	997백만원	3백만원	99%	100%

- 사업추진현황

- 투융자 심사 : '06. 10월
- 공유재산관리계획 승인 : '06. 11월
- 기본 및 실시설계 완료 : '06. 12월
- 일상감사 완료 : '07. 2월
- 공유재산관리계획 변경 승인 : '07. 7월
- 국유임야 매입 및 등기신청 완료 : '07. 8월

- 백두대간생태교육장 공사 계약 및 착공 : '07. 9월
- 백두대간생태교육장 전시, 전시전기공사 계약 및 착공 : '08. 9월
- 백두대간생태교육장 건축, 전기, 소방, 통신공사 준공 : '08. 12월
- 백두대간생태교육장 전시, 전시전기공사 준공 : '09. 2월
- 전시체험시설 제안공모 완료 및 계약 : '09. 4월
- 야외전시조경공사 착공 : '09. 5월
- 전시체험시설 전기, 소방, 통신공사 착공 : '09. 6월
- 야외전시조경, 전시체험시설 제작설치, 전기, 소방공사 설계변경 : '09. 9월
- 전시체험시설(지하) 및 야외전시조경 완료 : '09. 9월
- 백두대간 생태교육장 개관 : '09. 10. 28.

□ 사업효과

- 백두대간의 역사, 생태계 등 정보를 제공하는 전문 문화공간 확보
- 체험·학습프로그램 운영으로 대국민 인식전환 및 전통문화 선양

□ 전경사진

